


ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessor	Onderdeel	September	October	November	December	January	February	March	April	May	June	July	August	September
			00 Voorgevel	0d																	
			01 Werfinrichting	21d																	
2			Werfaansluiting elektriciteit	1 day	Mon 26/08/24	Mon 26/08/24		01 Werfinrichting													
3			Plaatsen werfketen en bescherming openbaar domein	1 day	Mon 26/08/24	Mon 26/08/24		01 Werfinrichting													
8			Maken opvangbakken	4 days	Wed 18/09/24	Mon 23/09/24	5	01 Werfinrichting													
9			Inrichten stelling	4 days	Wed 18/09/24	Mon 23/09/24	5	01 Werfinrichting													
			02 Stelling en lift	196d																	
4			Plaatsen stelling	5 days	Mon 9/09/24	Fri 13/09/24		02 Stelling en lift													
5			Plaatsen lift	2 days	Mon 16/09/24	Tue 17/09/24	4	02 Stelling en lift													
6			Afbraak steling	6 days	Tue 1/07/25	Tue 8/07/25	7	02 Stelling en lift													
7			Afbraak lift	1 day	Mon 30/06/25	Mon 30/06/25	30	02 Stelling en lift													
			03 Afbraak	34d																	
10			Afbraak leuningen / schermen	4 days	Tue 24/09/24	Fri 27/09/24	8	03 Afbraak													
11			Afbraak gevel / dorpels / silicone	30 days	Mon 30/09/24	Wed 13/11/24	10	03 Afbraak													
12			Afbraak balkondelen / afvoeren	30 days	Mon 30/09/24	Wed 13/11/24	10	03 Afbraak													
13			hoofddak verwijderen waterdichtingslagen	10 days	Mon 30/09/24	Fri 11/10/24	10	03 Afbraak													
14			hoofdak verwijderen randaansluitingen, ...	10 days	Mon 30/09/24	Fri 11/10/24	10	03 Afbraak													
			04 Betonherstel	60d																	
15			Betonherstel	60 days	Thu 14/11/24	Wed 19/02/25	12	04 Betonherstel													
16			Betonherstel gietmortel - heraangieten balkondelen + terrasrand	60 days	Thu 14/11/24	Wed 19/02/25	12	04 Betonherstel													
17			Betonherstel spuitmortel	60 days	Thu 14/11/24	Wed 19/02/25	12	04 Betonherstel													
18			Metselwerk	60 days	Thu 14/11/24	Wed 19/02/25	12	04 Betonherstel													
			05 Gevelvorbereiding	95d																	
19			PUR afdichting	30 days	Mon 30/09/24	Wed 13/11/24	10	05 Gevelvorbereiding													
20			Waterdichting rond de ramen	5 days	Thu 20/02/25	Wed 26/02/25	15	05 Gevelvorbereiding													
21			uitkappen + egalistaie + EPDM dorpels	5 days	Thu 20/02/25	Wed 26/02/25	15	05 Gevelvorbereiding													
			06 Terraswerken	45d																	
22			V1 - V9 Hellingschape	10 days	Thu 20/02/25	Wed 5/03/25	16	06 Terraswerken													
23			V1 - V9 Droogtijd chape - weersafhankelijk	10 days	Thu 6/03/25	Wed 19/03/25	22	06 Terraswerken													
24			V1 - V9 Triflex BTS-P	25 days	Thu 20/03/25	Wed 30/04/25	23	06 Terraswerken													

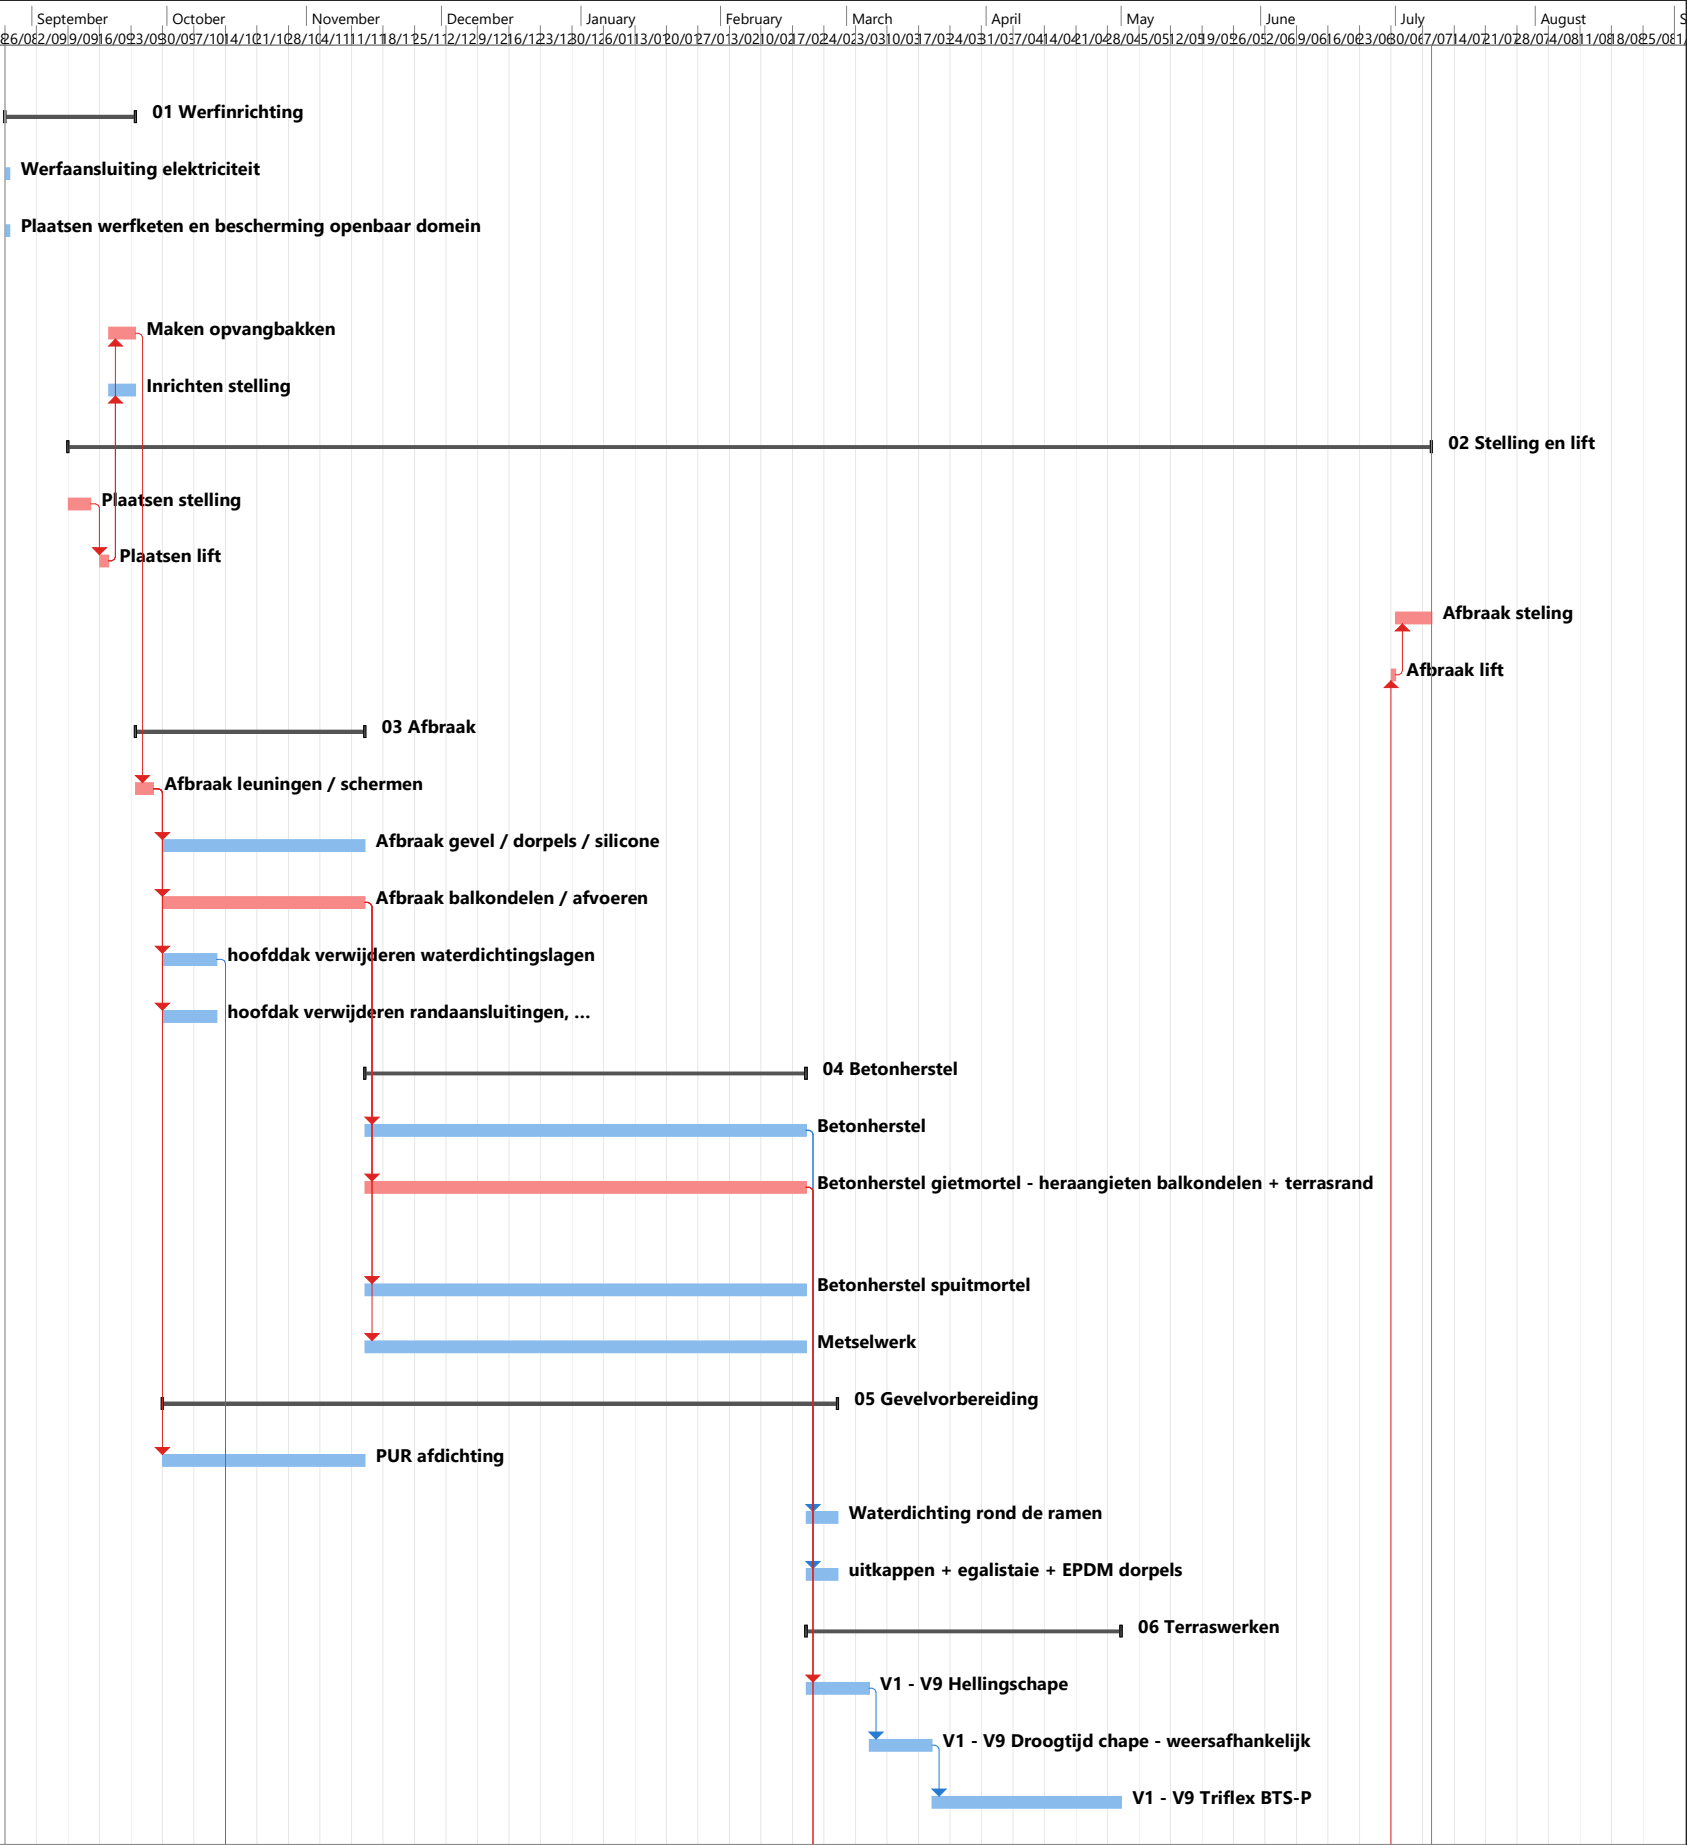

Project: 224-002 Res Acapulco
Date: Wed 14/08/24
Arne Buckens

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Critical

Critical Split

Progress

Manual Progress

Page 1
De Planning is opgemaakt onder voorbehoud van weerverlet, wijzigingen, levering materialen, ...

